

ความคืบหน้าของโครงการ

วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2566

การรื้อถอนอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ประตู แอร์ ขยะภายในห้อง ราวผ้าม่าน และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ พร้อมขนย้ายสิ่งของที่รื้อถอนไปยังจุดจัดเก็บ และขนของไปทิ้ง ทั้งหมดจำนวน 4 ห้อง

ชั้น 4 : ห้อง 34/77




ชั้น 4 : ห้อง 34/78



ชั้น 8 : ห้อง 34/211



ชั้น 8 : ห้อง 34/212

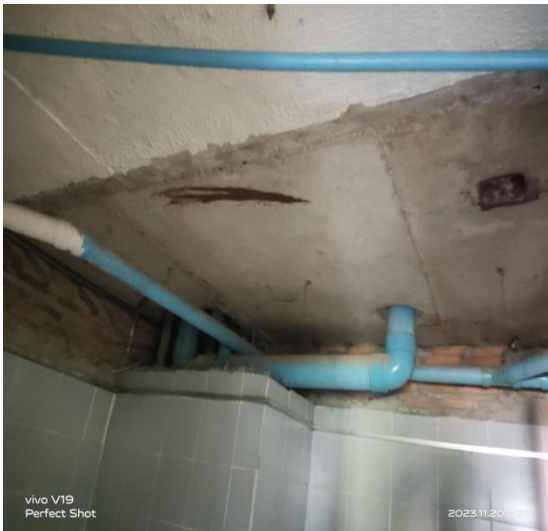

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566


งานผนัง ทาสีฝ้า เพดาน, ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น, เปลี่ยนสุขภัณฑ์, ยาแนวพื้น
ทั้งหมดจำนวน 4 ห้อง

ชั้น 4 : ห้อง 34/77

หัวข้อ : งานผนัง ทาสีฝ้า เพดาน (เสร็จเรียบร้อย 100%)



หัวข้อ : ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (เสร็จเรียบร้อย 100%)

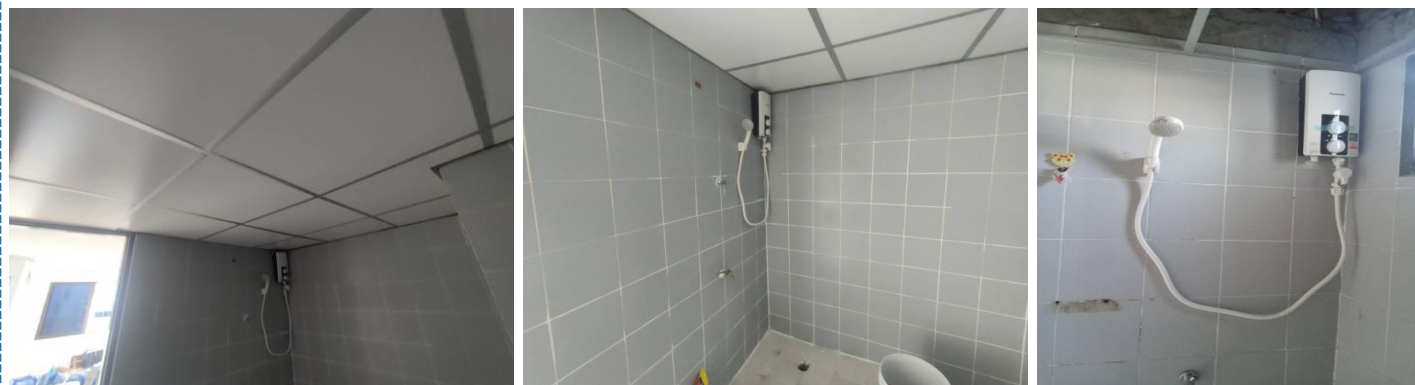

ชั้น 4 : ห้อง 34/77



หัวข้อ : เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (เสร็จเรียบร้อย 80%)



หัวข้อ : ยานแนวพื้น (เสร็จเรียบร้อย 90%)



ชั้น 4 : ห้อง 34/78

หัวข้อ : งานผนัง ทาสีฝ้า เพดาน (เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%)



หัวข้อ : ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%)



ชั้น 4 : ห้อง 34/78

หัวข้อ : เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (เสร็จเรียบร้อย 80%)




หัวข้อ : ยานแนวพื้น (เสร็จเรียบร้อย 90%)




ชั้น 8 : ห้อง 34/211



หัวข้อ : งานผนัง ทาสีฝ้า เพดาน (เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%)

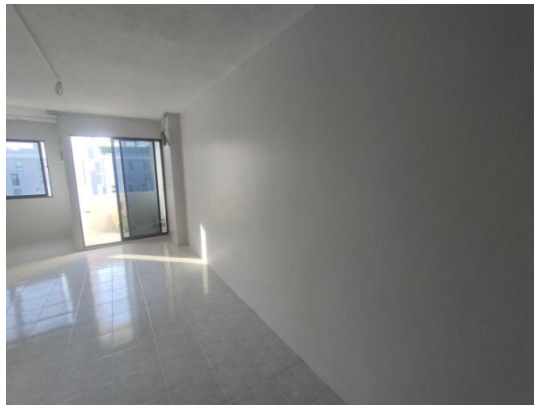

หัวข้อ : ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%)

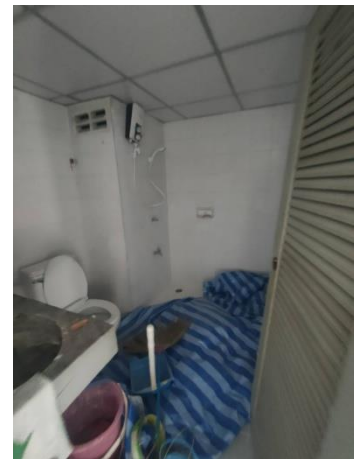

ชั้น 8 : ห้อง 34/211

หัวข้อ : เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (เสร็จเรียบร้อย 80%)



หัวข้อ : ยานแนวพื้น (เสร็จเรียบร้อย 90%)



ชั้น 8 : ห้อง 34/212

หัวข้อ : งานผนัง ทาสีฝ้า เพดาน (เสร็จเรียบร้อย 100%)



หัวข้อ : ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (เสร็จเรียบร้อย 100%)




ชั้น 8 : ห้อง 34/212

หัวข้อ : เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (เสร็จเรียบร้อย 80%)



หัวข้อ : ยานแนวพื้น (เสร็จเรียบร้อย 90%)


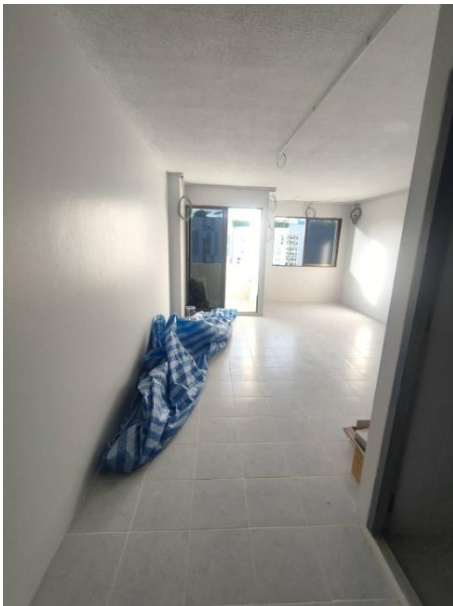


ความคืบหน้าของโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด จำนวน 4 ห้อง



งานระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - 19 มกราคม 2567

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- งานติดตั้งฝ้าผ้ากันน้ำ 100% (ประตูบานเลื่อน และหน้าต่าง)
- งานเฟอร์นิเจอร์ (ชุดเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง)
- งานเดินท่อ PPR + ติดก๊อมน้ำที่ระเบียง

หัวข้อ : งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%)



หัวข้อ :งานติดตั้งผ้าม่านทึบแสง 100%
(ประตูบานเลื่อน และหน้าต่าง) (เสร็จเรียบร้อย 100%)

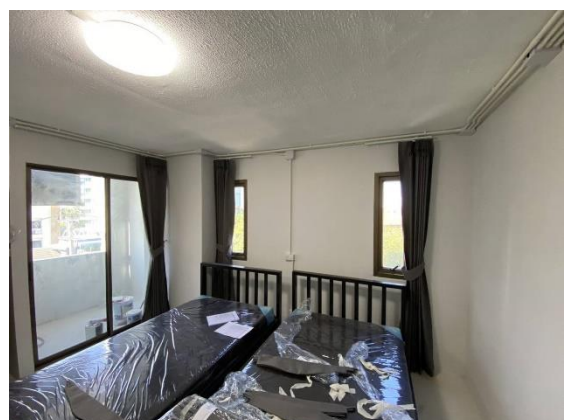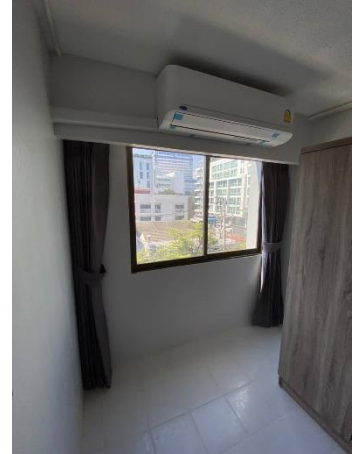

หัวข้อ : งานเฟอร์นิเจอร์ (ชุดเตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง) (เสร็จเรียบร้อย 100%)



หัวข้อ : งานเดินท่อ PPR + ติดก๊อกรน้ำที่ระเบียง (เสร็จเรียบร้อย 100%)

