

**พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560**

**หมวด 9
การทำสัญญา**

- การทำสัญญา ม. 93 - 96**
 - การแก้ไขสัญญา ม.97 *
- การประกาศเผยแพร่สัญญา ม.98

**หมวด 10
การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ**

- หน้าที่การบริหารสัญญา ม.100**
 - งานก่อสร้าง ม. 101
- การงด/ลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ม.102 *

ใคร ? มีหน้าที่ บริหารสัญญา

ม. 100 วรรคหนึ่ง

- ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจ **แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** **เพื่อรับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ**

ม. 105

- รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน**การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ** **ที่ไม่ได้บัญญัติ** ไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีกำหนด

หลักการ / แนววินิจฉัย
(ก่อน พรบ.ชื่อจ้างฯ)



ใคร ? มีหน้าที่ บริหารสัญญา

ที่ นร (กพ) 305/ว 11948 ลว. 13 ร.ค. 2543

- ❑ หากมีความจำเป็นต้อง **แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง** หรือพิจารณา **ขยายเวลา** ทำการตามสัญญา การงัด **หรือลดค่าปรับ**
- ❑ ให้ **คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** หรือ **คณะกรรมการตรวจการจ้าง** แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ ... ในแต่ละครั้งด้วย

ที่ กค (กพ) 0408.4/28514 ลว. 12 ต.ค. 2548

- ❑ **เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** หรือ **คณะกรรมการตรวจการจ้าง**
- ❑ โดยปกติ **ต้องมีหน้าที่บริหารสัญญา** กล่าวคือ เมื่อสัญญาครบกำหนด จะต้องแจ้งให้ผู้ขาย หรือรับจ้าง ส่งมอบงานตามสัญญา **เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการ** ให้มีหนังสือแจ้งเตือน แจ้งปรับ แล้วแต่กรณี

**“ หากมิได้ดำเนินการ
จะถือว่าละเลย ไม่ดำเนินการตามหน้าที่ ”**


สรุป หลักการ / แนวทาง 4

- ความผิดหน่วยงานรัฐ
- เหตุสุดวิสัย
- พฤติการณ์ไม่ต้องรับผิด

➤ **นิติกรรมฝ่ายเดียว**

การงด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ม. 102 + ข้อ 182

ขยายเวลา	งด หรือลดค่าปรับ
-----------------	-------------------------

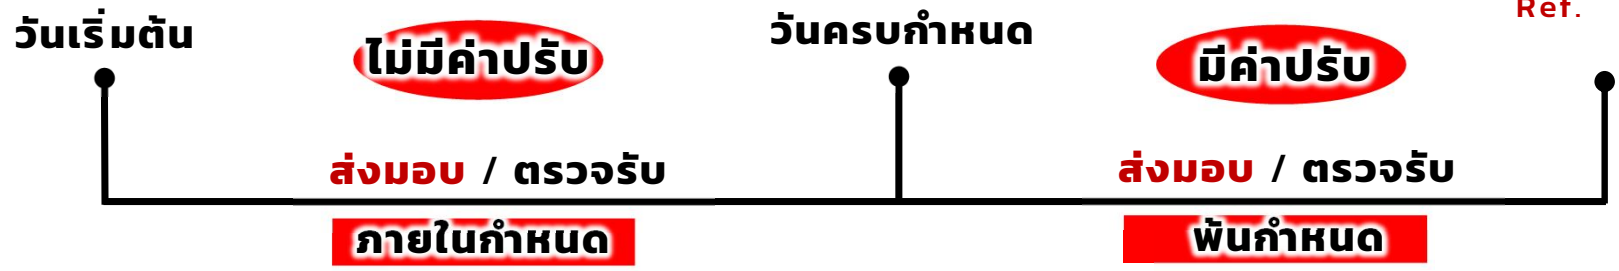

แก้ไขสัญญา (ก่อนตรวจรับ)

การแก้ไขสัญญา ม. 97 + ข้อ 165

- จำเป็น
- หน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์
- เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐ / สาธารณะ

➤ **นิติกรรมสองฝ่าย**

Ref. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลว.31 ม.ค. 2562
ที่ us (กหว) 1305/10406 ลว. 18 ส.ค. 2541

Update

การบริหารสัญญาฯ



ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

แนวทาง & หลักการ
ใหม่ๆ เพิ่มเติม





ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว. 17 ก.ย. 2562

ข้อ 3 จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๓. ก่อนลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้หน่วยงานของรัฐเจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาปรับลดตามความเหมาะสมแล้วแต่ไม่สามารถเจรจาดกตกลงกันได้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ภายใต้ราคาที่เสนอไว้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาเพื่อปรับลดทุกรายการได้ ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลงฯ ตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการก็ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาตามความเหมาะสม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ราคาที่เสนอไว้

เจรจาปรับลด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ทุกรายการ (%)

"เจ้าหน้าที่" ดำเนินการปรับลด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

หรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ตามความเหมาะสม

"กค. กำหนดราคากลาง" ประเมินราคาและปรับลด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

หลักการ / แนววินิจฉัย
(ก่อน พ.ร.บ.ซื้อจ้างฯ)



ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3373 ลว. 4 ต.ค. 2550

ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 3373



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎางค์ กทม. 10200

4 ตุลาคม 2550

เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน

มาตรการที่ 5 การจัดทำสัญญา

ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณและราคา (Bill of Quantity) ที่ผู้เสนอราคายื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรจ้างได้เสนอไว้กับราคากลาง เป็นอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) แล้วนำอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ไปคูณกับราคากลางต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการเป็นราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ และคูณกับปริมาณงานแต่ละรายการเป็นราคางานแต่ละรายการ ผลรวมของราคาที่ได้ทุกรายการถือเป็นราคารวมที่ประเมินได้ ทั้งนี้ ให้คิดค่าทศนิยม 2 ตำแหน่งทุกขั้นตอน (ตำแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้งห้ามปัดเศษขึ้น) และให้ใช้ราคาที่ประเมินได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

เดิม

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว. 17 ก.ย. 2562

ข้อ 4 กำหนดราคากลางใหม่ / เปรียบเทียบ

๔. กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปและรายการละเอียด เป็นเหตุให้ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐกำหนดนั้นต่ำเกินไป หรือสูงเกินความเป็นจริง ให้หน่วยงานของรัฐ คำนวณราคากลางใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นราคาเปรียบเทียบ หากกรณีปรากฏ ดังนี้


แบบฟอร์ม B.O.Q. คลาดเคลื่อน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตรา	รวม	หมายเหตุ
➤	ต่ำเกินไป					
➤	สูงเกินความเป็นจริง					



แบบฟอร์ม B.O.Q. ที่ถูกต้อง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตรา	รวม	หมายเหตุ
➤	คำนวณใหม่					




แบบรูปและรายการละเอียด

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว. 17 ก.ย. 2562

ข้อ 4.1 ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอต่ำกว่า ...ดำเนินการตามข้อ 3

๔.๑ ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้เสนอราคาตามแบบรูปและรายการละเอียด ซึ่งได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้อง และต่ำกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการตามข้อ ๓

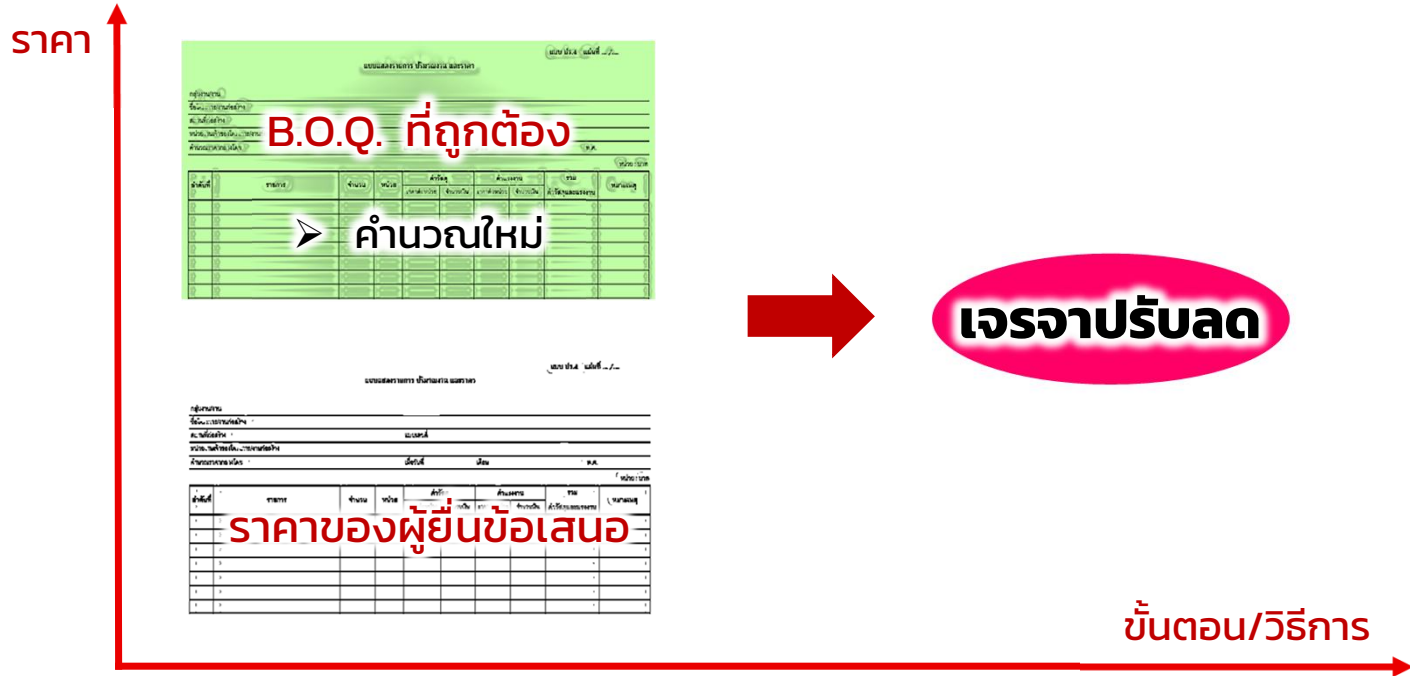


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว. 17 ก.ย. 2562



ข้อ 4.2 ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอสูงกว่า ต่อรองราคา


๔.๒ กรณีราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ที่ได้เสนอราคาตามแบบรูปและรายการละเอียด ได้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่ โดยถูกต้องและสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการฯ **ต่อรองราคา** หากต่อรองราคาแล้ว กรณีปรากฏดังนี้

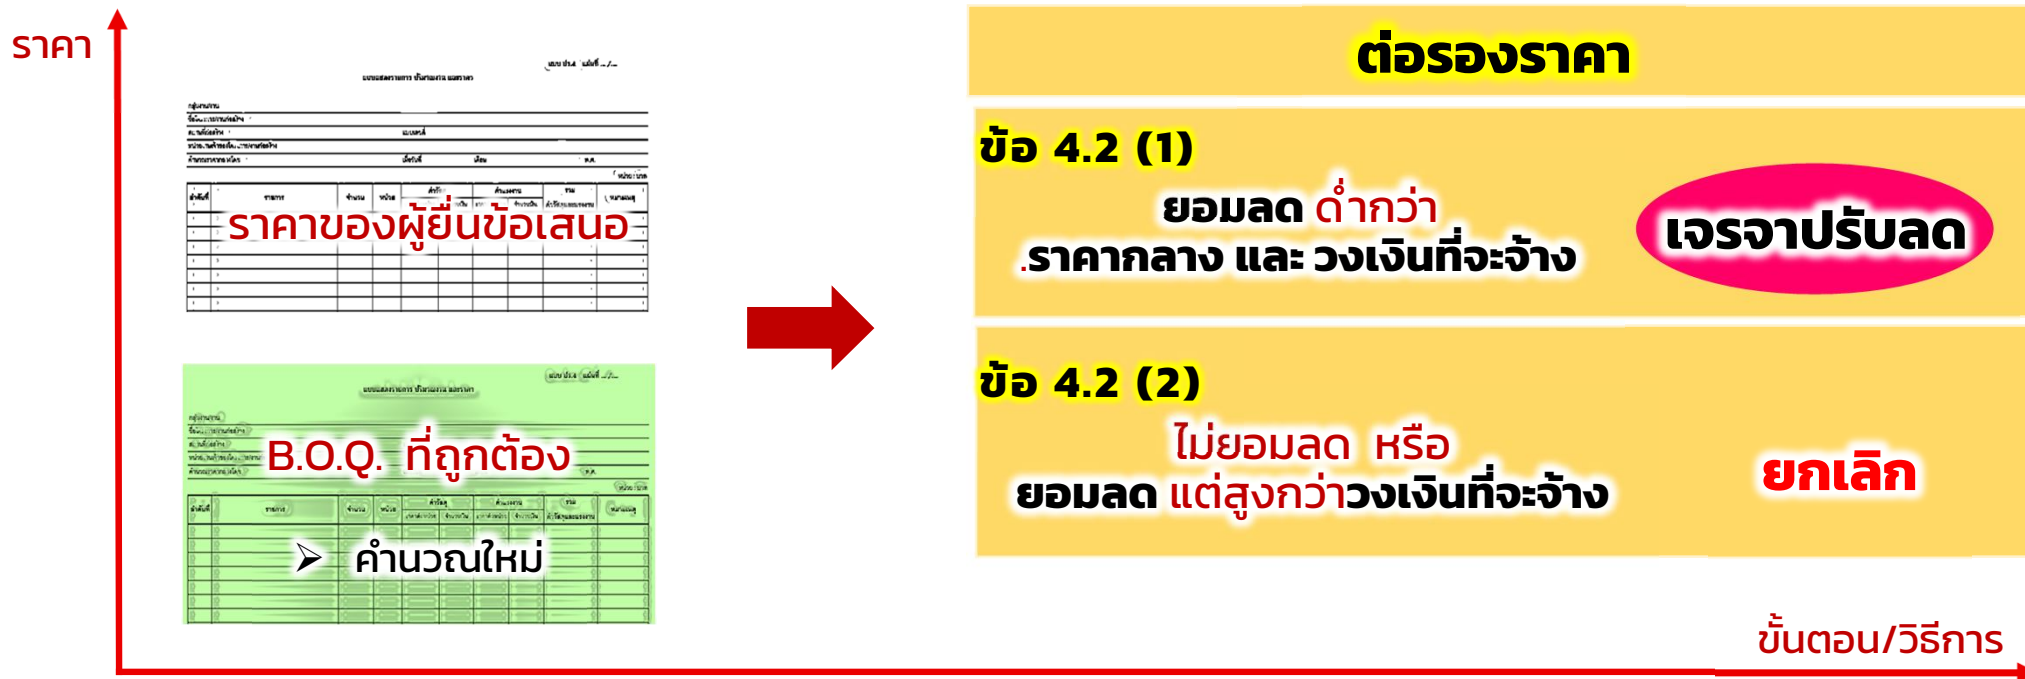

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลว. 24 พ.ย. 2565

ข้อ 5 แนวทางการบอกเลิกสัญญาและการคิดค่าปรับ


ข้อ 5.1 กรณีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

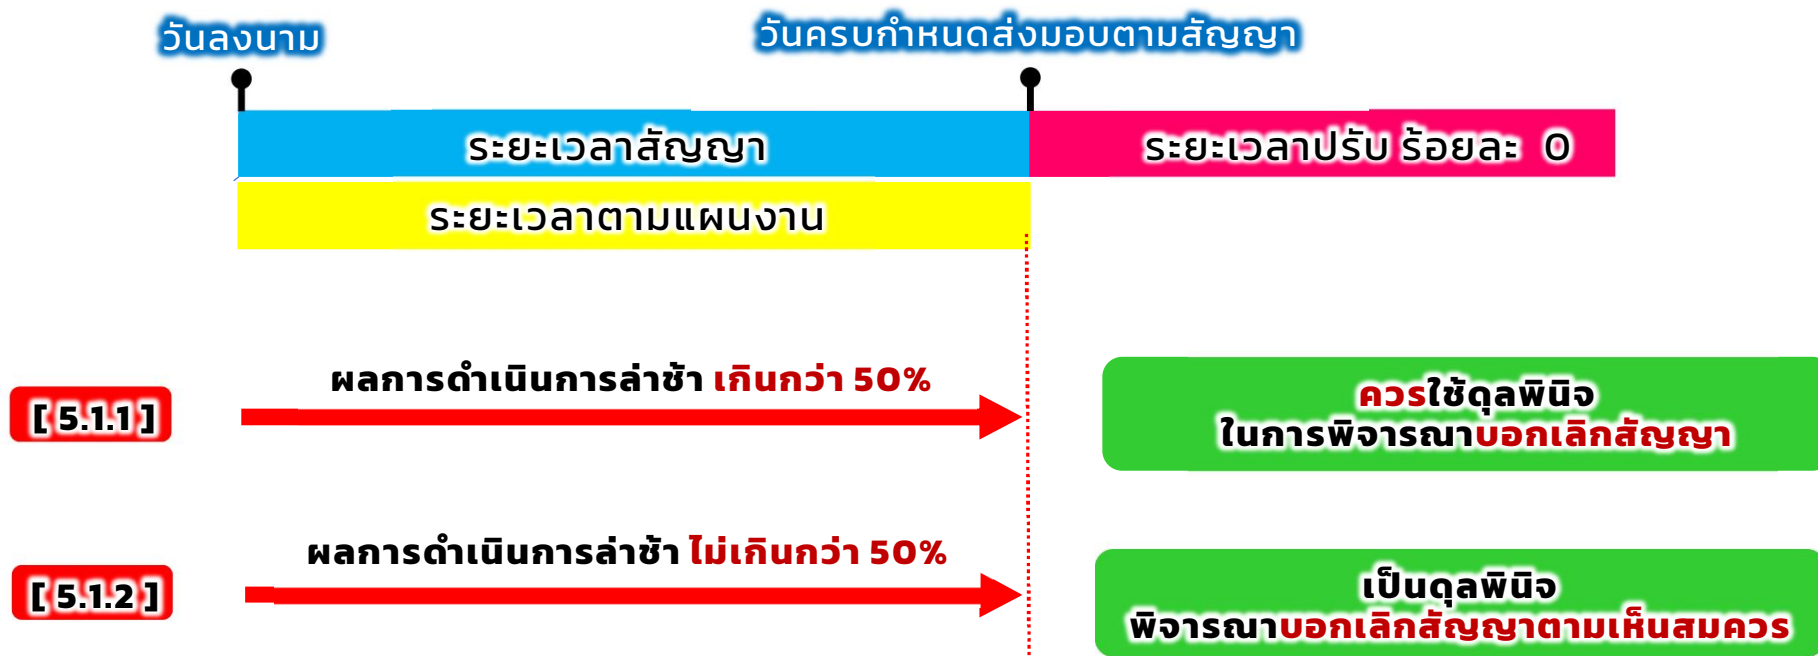

* ข้อ 2.4 งานงวดเดียว/เนื้องานที่เหลือไม่เกิน 60 วัน /วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะทำแผนงานใหม่ หรือไม่ก็ได้

ด่านที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลว. 24 พ.ย. 2565

ข้อ 5.2 กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

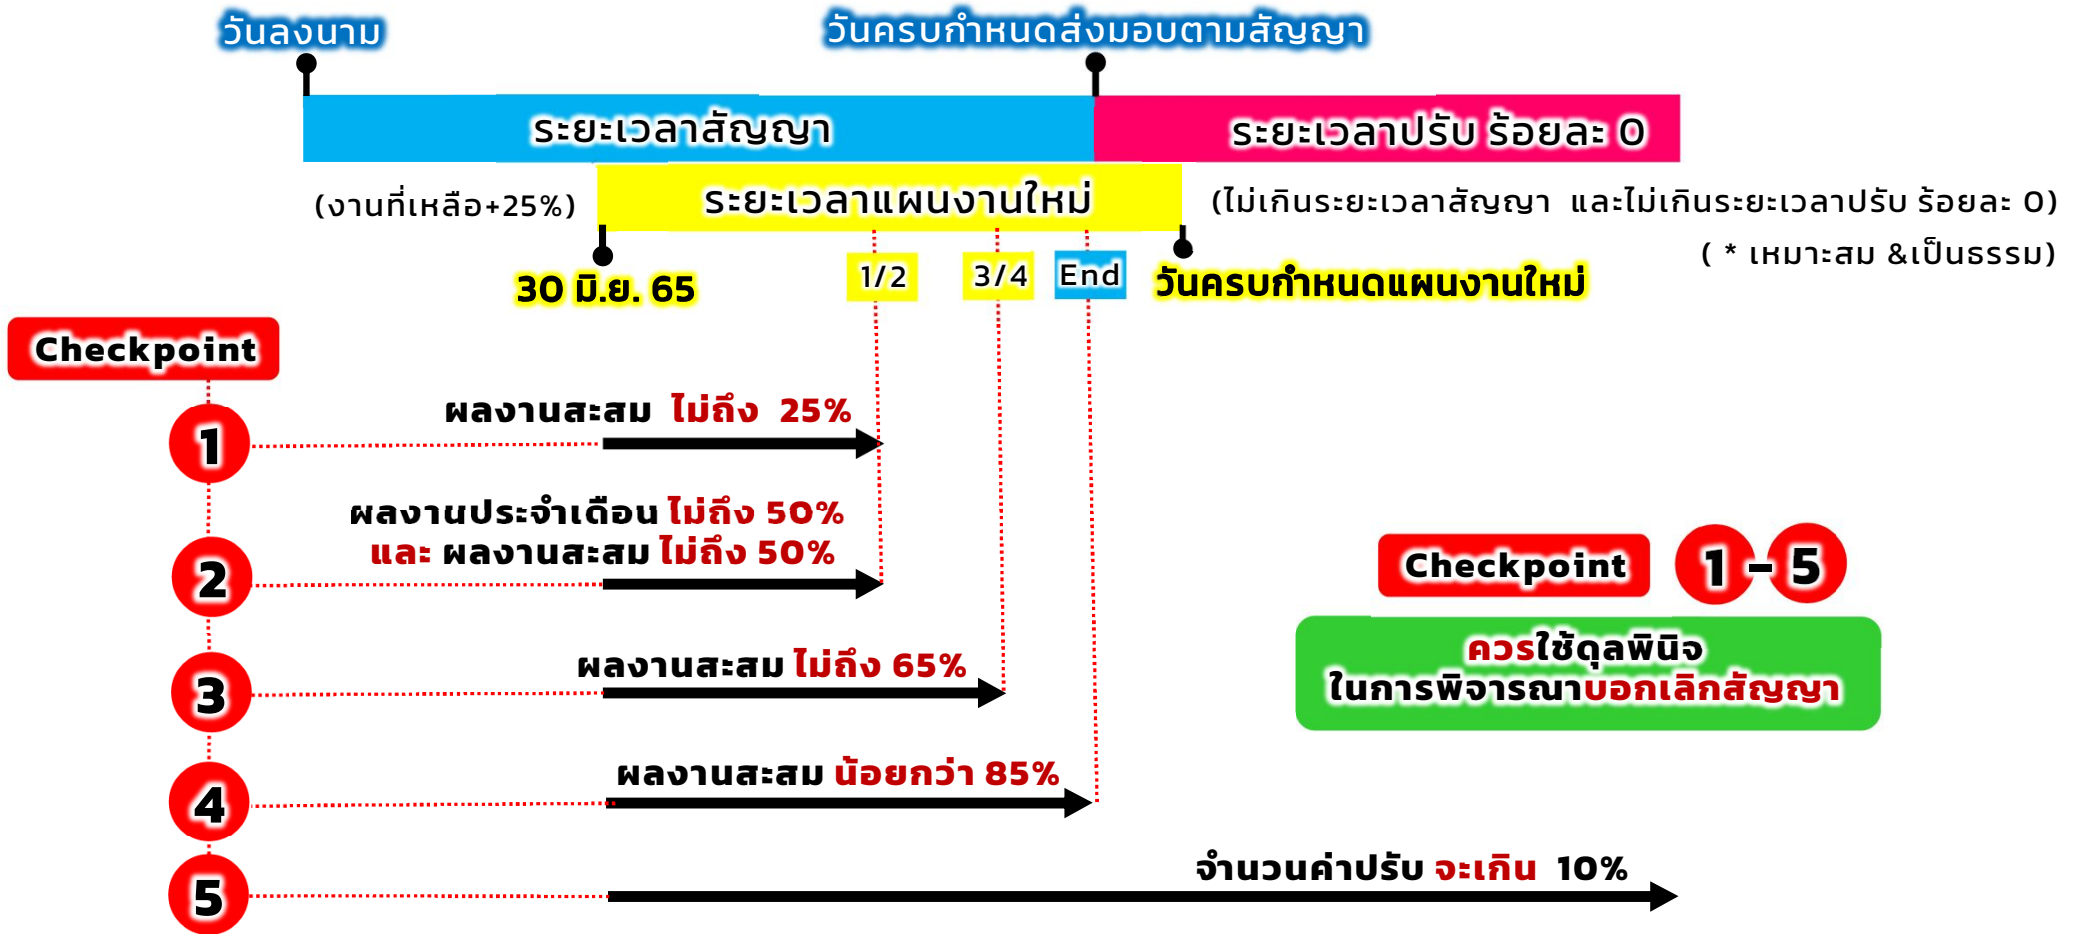

หลักการ / แนววินิจฉัย (พสบ.ชื่อจ้างฯ)



ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459

ข้อ 3.2.2

ที่คำนวณได้ดังกล่าวมานั้นระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วนั้น จะต้องไม่เกินจำนวนระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 13902

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๓๙๐๒




NEW

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อหารือพร้อมคำวินิจฉัยกรณีแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
สำหรับสัญญาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

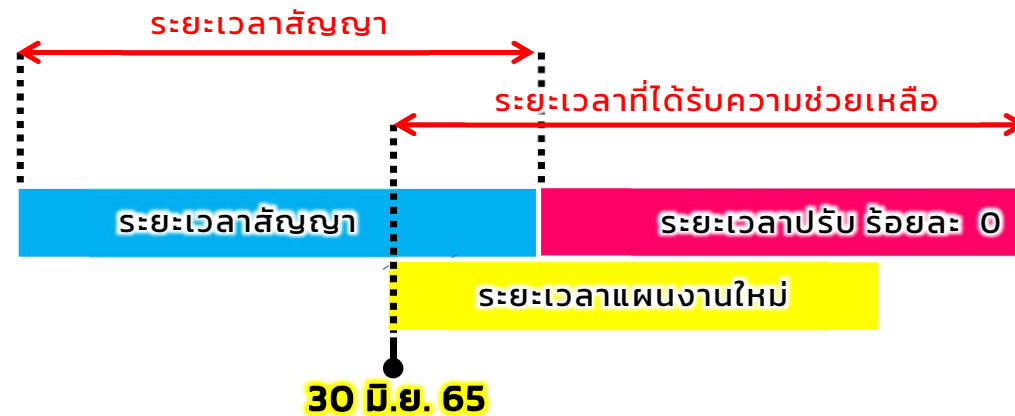

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลว. 1 มี.ค 2566

ข้อ 2 แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

คก.ตรวจรับพัสดุ **จะต้อง** บริหารสัญญา (ม.100 วรรคหนึ่ง)

ข้อ 2.1 การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

- ลงนามแล้ว ไม่เข้าดำเนินการ
- นส.แจ้งเร่งรัด **ไม่**เข้าดำเนินการ

- เข้าดำเนินการแล้ว **ล่าช้า**
- นส.แจ้งเร่งรัด **ล่าช้า**




ควรใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณา**บอกเลิกสัญญา**
ม.103 วรรคหนึ่ง (2)


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลว. 1 มี.ค 2566



ข้อ 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

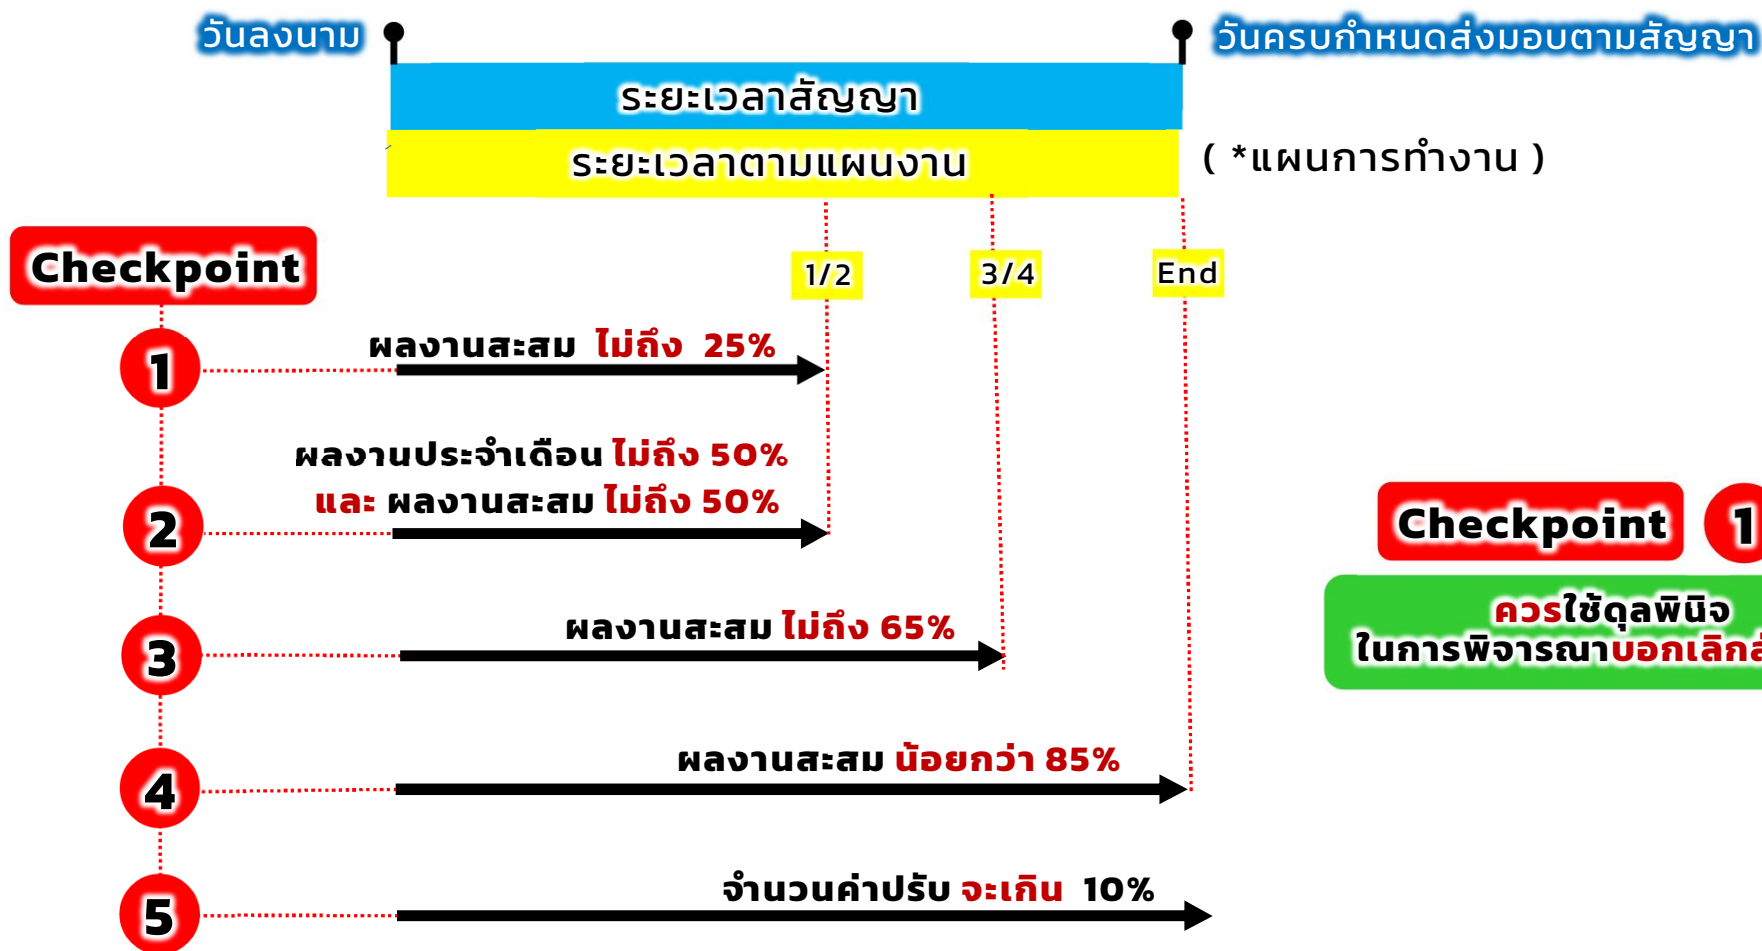

ว 1459

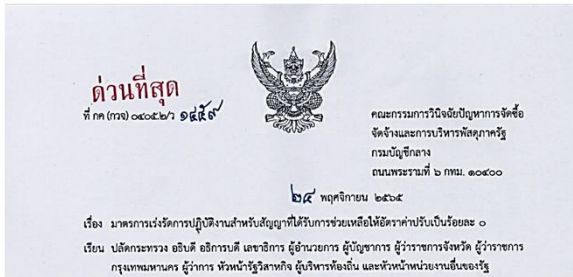

- งวดเดียว/ไม่เกิน 60 วัน/ไม่เกิน 5 แสน จะทำหรือไม่ก็ได้

มาตรการเร่งรัด

สัญญาค่าปรับ ร้อยละ 0
(ว 693 + ว 645)

แผนการทำงานใหม่
(แก้ไขสัญญา)

คค.ตรวจรับ
(+ คู่สัญญา)

Checkpoint

- 1 ผลงานสะสม **ไม่ถึง 25%**
- 2 ผลงานประจำเดือน **ไม่ถึง 50%**
และ ผลงานสะสม **ไม่ถึง 50%**
- 3 ผลงานสะสม **ไม่ถึง 65%**
- 4 ผลงานสะสม **น้อยกว่า 85%**
- 5 จำนวนค่าปรับ **จะเกิน 10%**

ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

ว 124



* ข้อ 2.2.1-2.2.5
ไม่ใช้กับงานก่อสร้างบำรุงทาง

แนวทางปฏิบัติเร่งรัด

สัญญา
(จัดซื้อจัดจ้าง)

แผนงานการทำงาน
(ตามสัญญา)

คค.ตรวจรับ

แนวทาง & หลักการ ใหม่ๆ เพิ่มเติม

NEW



ด้วยที่สั่ง
พ.ศ. (กษ) ๑๕๐๕๖/๒๕๖๒

เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือ
เงิน ปลัดกระทรวง อธิบดี อัย
การแทนหนชกร ผู้ว่าการ

ตามที่คณะรัฐมนตรี
ผู้ประกอบกรในช่วงการแพร่ระบาด
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจาก
เป็นอัตรา หรือลด ๐ ซึ่งกรมบัญชี
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจ
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่อ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินค่า
ร้อยละ ๑๐๐ บาท โดยมีวิธีการสร
งวัสดุที่ขาย แต่ยังไม่ได้มีการสร
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการ
๒๐๑๕ ตามแนวทางการที่คณะรัฐมนตรี
ผู้ประกอบกรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในระร
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖๒
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา หรือลด ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คว ามช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

แนวทาง & หลักการ ใหม่ๆ เพิ่มเติม

NEW



ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๒๓๑ ๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหารือการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกิจการยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๑/๑๕๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

และเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา โดยหลักการ
การพิจารณาตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒ นั้น สามารถแบ่งได้เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การงดหรือลดค่าปรับ
ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาว่างเว้นกำหนดระยะเวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว
และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาและค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น กรณีตามข้อหารือ

จะใช้ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา



ขณะพิจารณาอนุมัติ

แนวทาง & หลักการ ใหม่ๆ เพิ่มเติม

NEW

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๒๓๑๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. กรณีข้อหารือ ๒ - ๔ ในการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หน่วยงานของรัฐจะต้องคิดค่าปรับ
นับวันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
โดยหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ไปในการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง สำหรับการคิดค่าปรับนั้น
หากในสัญญาจ้างมิได้กำหนดค่าปรับเป็นรายงวดไว้ กรณีนี้ค่าปรับจะคิดคำนวณถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ
งานงวดสุดท้ายตามสัญญา

งด หรือลดค่าปรับ



หักระยะเวลา คค. ใช้ในการตรวจรับ



แนวทาง & หลักการ ใหม่ฯ เพิ่มเติม

NEW

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๒๓๑๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘๑ และข้อ ๑๘๓ ประกอบกับหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓๓
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อไป สำหรับการคิดค่าปรับ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำนวนค่าปรับตามสัญญา
เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้พิจารณาบอกเลิกสัญญา หน่วยงานของรัฐ
จึงต้องปรับผู้รับจ้างเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา

ค่าปรับเกิน 10 %



ต้องปรับเต็มจำนวนที่กำหนด



แนวทาง & หลักการ ใหม่ๆ เพิ่มเติม

NEW



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ขอหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง (อบต. หัวสำโรง) ได้ว่าจ้างบริษัท ที เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๓๓ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕, ๖, ๑๐ จากบ้านอ่าวช้างไล่ - บ้านใหม่ - บ้านแหลมหน้า ตำบลหัวสำโรง อำเภอปลวกแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๐ วัน โดยบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑๓ วัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ และ อบต. หัวสำโรง ได้มีการหักค่าปรับไว้จำนวน ๘๖,๐๕๐ บาท รวมทั้งเบิกจ่ายค่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว กรณีนี้ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัย จะต้องพิจารณาแต่อย่างใด


ตรวจรับ หักค่าปรับ เบิกจ่ายแล้ว → สิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

แนวทาง & หลักการ ใหม่ๆ เพิ่มเติม

NEW



ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕.๔/๕๙๖๓๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด่วน ที่ พน ๐๕๑๑/๑๓๓๓๕ ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. กรณีตามข้อหารือ ๑ - ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ จากบริษัท แอมไพร์ ไมโครซิส จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๓/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในวงเงินจำนวน ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีการแจ้งขอให้ พพ. พิจารณาเปลี่ยนรุ่นคอมพิวเตอร์และขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศผู้ผลิต ทำให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครบถ้วนตามรายการสัญญา ซึ่ง พพ. และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และบริษัทฯ ได้ส่งมอบพัสดุเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบแล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ได้นำรายงานการตรวจรับพัสดุเสนอผู้มีอำนาจเพื่อทราบ กรณีดังกล่าวถือว่าการตรวจรับพัสดุยังไม่เสร็จสิ้น และยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๓ โดย พพ. สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับเพื่อกำหนดอัตราค่าปรับจากอัตราเดิม เป็นอัตราร้อยละ ๐ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ ต่อไป

ยังไม่นำรายงานตรวจรับ เสนอ




ตรวจรับไม่เสร็จสิ้น แก้ไขสัญญาได้

แนวทาง & หลักการ ใหม่ฯ เพิ่มเติม

NEW



ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒ ๐๒๙๙



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวลอย

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ที่ สบ ๗๔๗๐๔/๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
และ ที่ สบ ๗๔๗๐๔/๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ให้สอดคล้องกันต่อไป” โดยมาตรการฯ ดังกล่าวได้ยกเว้นกรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแต่ยังมีได้
มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทาง
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งหากการดำเนินการตามสัญญาอยู่ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสัญญามีค่าปรับเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าว
ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาได้ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่จำเป็นต้องรอผู้ประกอบการ
แจ้งความประสงค์แต่อย่างใด

แก้ไขสัญญา ... ตามมาตรการ



ไม่จำเป็นต้องให้ พรจ. แจ้ง/ขอ

ระเบียบพกค.๗

ข้อ 175

คก.ตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวน ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการ ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

ระเบียบกค.๔



ข้อ 176

กค.ตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างให้อำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดুবางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)
